

## フェロシートの四日市工場内一時保管について

各地区から回収されトラックで搬入されて来たフェロシートは 四日市 工場内の一時保管場に一時保管されます。

バラ品の場合は、管理型最終処分場と同等の仕様で建設し三重県の完成検査を受けた一時保管場に搬入されます。  
一時保管場の土間は遮水シートが入ったコンクリート舗装を行い下部の土壌に浸透しない構造としています。  
一時保管場の雨水は各置場に設けたピットに集めてから廃水処理工場に送られ、外へ流出しないようにしています。  
また積み終わったフェロシートには雨水よけ、飛散防止のためシート掛け養生を行います。

フレコン袋に入ったフェロシートは舗装された場所なら置くことを許可されているため、場内各所の空いたスペースに置くようにしています。

破袋や荷崩れが起こらないよう最大でも三段積みまでとし、シート掛け養生を行って一時保管されます。  
ただ工場内で確保できるスペースに限りがあるため一部では道路なども使っているような状況です。  
従って狭くなったり見通しの悪くなった場所を通行される時は交通安全に十分注意していただくをお願いします。

なお、南部駐車場も一時保管場所とすることを検討しており、その場合は総合グラウンド(技研棟前)を代替駐車場とする予定です。

このようにフェロシートを場内一時保管することによって土壌、地下水、海など環境が汚染されることはありません。


これら一時保管に関わる作業はすべて三重県や四日市市の指導と正式手続きに基づいて実施しています。  
搬入・場替え・搬出の移動は逐一産業廃棄物管理票により管理するなど、最終処分場へ搬出する時まで安全に維持管理されます。

また場外の運搬も地元自治会・漁協などの同意を得られた道路や通行台数に制限し、さらに塩浜街道交差点では交通監視員も配置しています。

※産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき排出業者が収集運搬業者または処分業者に対して交付し、委託した廃棄物の流れを常に把握して適正な処理が行われるよう監視するための7枚複写の伝票のことです。

### フェロシートの一時保管場配置図

青色:バラ品一時保管場 赤色:フレコン袋一時保管場 緑色:一時保管場予定地

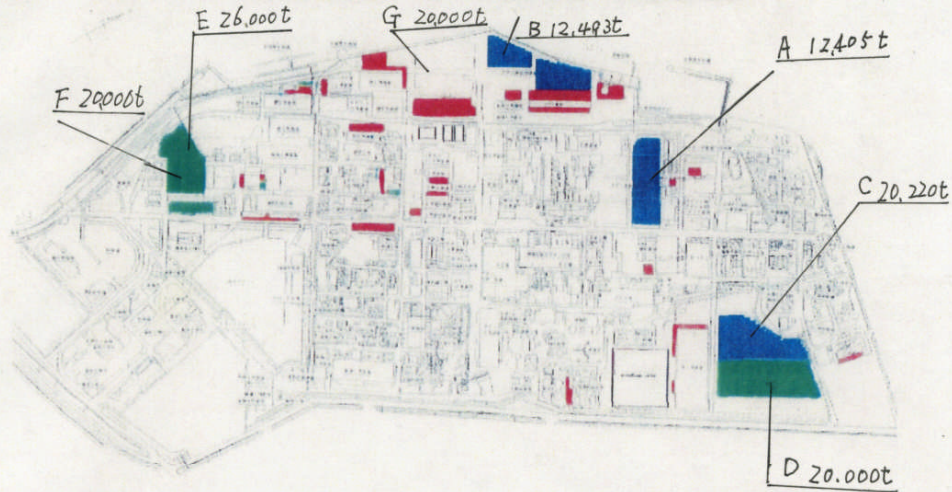

工場内一時保管場の様子

履行期限における撤去状況及び撤去延滞理由について

地区名 (撤入時期・目的)	当初回収 予定量(t)	撤去期限	撤去数量 BIR結果等	2月末 撤去数量	2月末 残量	撤去延滞理由	対策等	備考
可児市大森 一撤去中一 (H17/2) (埋戻し)	9,600	平成18年2月28日	22,800	16,551	6,249	①撤去数量が予定数量に対し増加 ②廃棄物指導等、諸準備により2ヶ月間工事停止 ③天候不順(12/19・20・21 2/1・16・20) ④工場搬入車数200台/日	H18/4/8完了予定 ハラにて工場位置き場撤去数4,800t バック詰めにて処分場へ搬出3,500t/1 ※3/10新に2000t免状増量となった。	1,200台は岐阜・愛知三重にて66~68t均等 8:30~16:00搬入時間 2.三重県民局週1回工場状況確認のため来場、通時指導 3.岐阜県工場位置き場状況(概)に回収した置き場
土岐市泉 一撤去中一 (H15/7) (造成)	32,000	平成18年2月28日	44,000	9,557	34,443	①撤去数量が予定数量に対し増加 ②作業性が現地地形から劣悪 ③天候不順(12/19・20・21 2/1・16・20) ④工場搬入車数200台/日	H18/7/10完了予定 ハラにて工場位置き場撤去数32,700t バック詰めにて処分場へ搬出1,743t/1 ※5月~6月ハラ増車を回る。	岐阜県工場位置き場状況 A:12,405(缶2)減杯 B:12,493(SR1)減杯 C:20,220(2G-1)3/13現在、3月下旬満杯 その他バック詰めにて保管中 ※今後使用及び工事着工置き場
土岐市鶴里 一撤去中一 (H15/2) (造成)	6,900	平成18年2月28日	9,000	594	8,406	①撤去数量が予定数量に対し増加 ②業者との協議難航 ③多くの地権者探しに時間を要したこと ④特別管理処理を一部実行計画 ⑤工場搬入車数200台/日	H18/5/16完了予定 ハラにて工場位置き場撤去数6,600t バック詰めにて処分場へ搬出1,806t/1	D:20,000(2G-2)保管可能 E:26,000(南駐1)4月/中旬使用可 F:20,000(南駐2)4月/下旬使用可 G:20,000(SR2)状況対応 ※今後の工場受入量は確保済
瑞浪市稲津 (H14/7) (H16/6)	10,000	平成18年2月28日	10,000 (推定)	-	10,000	①地権者の同意を得るべく努力中。	H18/7/31完了予定 全量処分場を確保後搬出	
恵那市三郷 一撤去中一 (H14/3) (造成)	30	平成18年2月28日	4,422	650	3,772	①撤去数量が予定数量に対し増加 ②地権者との交渉が2/2成立、その後調査、工事着手2/21開始と遅延 ③BIR調査が川べりまでフェロシルトが確認され、河川水対策で一時的工事中断	H18/4/19完了予定 ハラにて工場位置き場撤去数3,772t	
本巣市早野 一撤去中一 (H14/2) (埋戻し)	3,100	平成18年2月28日	26,000 (地権者T氏)	3,147	22,853	①撤去数量が予定数量に対し増加 ②撤去鉄板約400枚での準備工に時間を要したこと及び地下水位対策 ③天候不順が続いたこと(12/19・20・21 2/1・16・20) ④工場搬入車数200台/日	H18/6/30完了予定 ハラにて工場位置き場撤去数20,700t バック詰めにて処分場へ搬出2,153t/1	
岐阜市上西郷 一撤去中一 (H14) (埋戻し)	-	平成18年2月28日	18,000 (地権者N氏)	6,523	11,477	①地権者に時間を要した。 ②地下水位対策を検討 ③天候不順が続いた(12/19,20,21 2/1,16,20) ④工場搬入車数200台/日	H18/7/31完了予定 全量処分場を確保後搬出 H18/4/29完了予定 ハラにて工場位置き場撤去数9,800t バック詰めにて処分場へ搬出1,677t/1	※既に完了地区搬入時期、目的 久々利 H13/11 造成 美濃加茂 H17/5 改良土使用 陶 H14/8 造成 土岐津 H14/2 整地 土岐津 H14 整地 土岐津 H14 埋戻し
FS量合計(t)	61,630		180,222	37,022	123,200		ハラ工場位置き場撤去数 計 78,372t バック詰め処分場へ搬出 計 10,879t ハラ処分場直送搬出 計 36,000t	

撤去完了分 41,001t

(可児市大森A区16,659t,久々利19,630t,土岐津3,994t,陶554t,美濃加茂164t)


(2月末末撤去総合計41,001t+岐阜県37,022t=78,023t) 一内処分場21,208t 工場位置き56,815t

- ①現地でバック詰めすることにより、回収工事の工期短縮と処分場へ直送できる体制を準備します。
- ②大森バック作成数2,800t(現地保管)+増量分
- ③本巣市早野地区は、地下水処理対策の必要なくとも予想され、撤去工事の中断が懸念されます。
- ④美濃加茂市牧野・鈴屋地区は改良土業者と協議中





↑ 肥料工場跡地エリアのフレコン袋一時保管場(保管中)

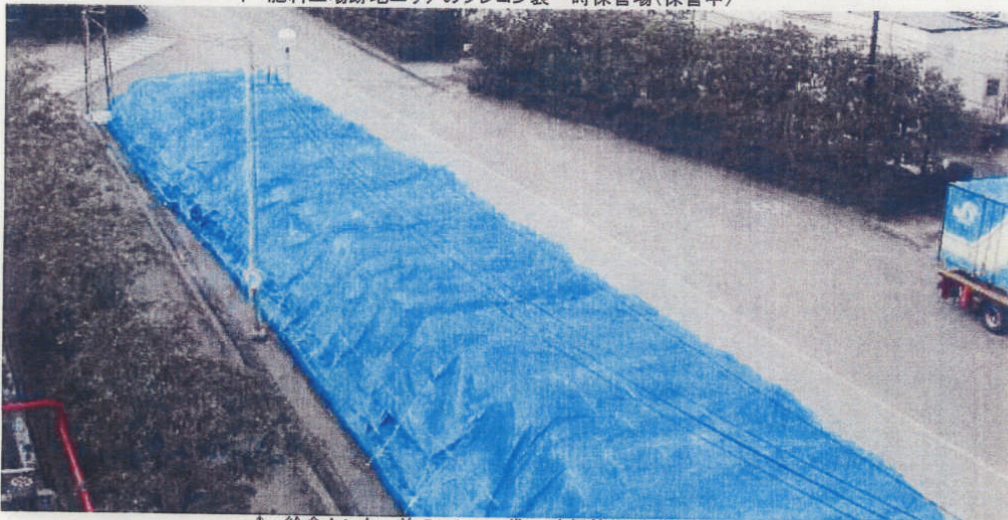

↑ 給食センター前のフレコン袋一時保管場(保管中)



↑ メイン道路のフレコン袋一時保管場(保管中)





↑ SR工場跡地エリアのバラ品一時保管場(完成直後)



↑ CL工場隣接エリアのバラ品一時保管場(完成直後)



↑ SR工場跡地エリアのバラ品一時保管場(搬入中)
